COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA (SI)

Realizzazione della nuova scuola materna di Ponte d'Arbia

LA miA scuolA respirA



PROGETTO ESECUTIVO

MontDA_E Doc 007

Il Responsabile del Procedimento: **Arch. Anna Calocchi**

Concorrente

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A.
Via Traversari 63
48121 - RAVENNA

R.T.P. di progettazione

Settanta7 Studio Associato
Arch. Daniele Rangone

Settanta7 Studio Associato
Arch. Elena Rionda

ANSALDI
STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
Ing. Alessandro Ansaldi

ANSALDI
STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
Ing.Riccardo Ansaldi

Arch. Rossi Fioravanti Tommaso

Ing. Luca Lussorio

Ing. Paoletti Francesco

Arch. Marina Castrovillari


CRONOPROGRAMMA

Novembre 2015

Questo elaborato è di proprietà del R.T.P. sopra citato. Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata .

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA_NUOVA SCUOLA MATERNA A MONTERONI D'ARBIA (SI)

ID	Task Name	Durata	Inizio	Fine
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	1 giorno	lun 11/01/16	lun 11/01/16
2	DEMOLIZIONE OPERE IN C.A.	2 giorn	mar 12/01/16	mer 13/01/16
3	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	4 giorn	gio 14/01/16	mar 19/01/16
4	GETTO DI PULIZIA	1 giorno	mer 20/01/16	mer 20/01/16
5	TRACCIAMENTO, REALIZZAZIONE E GETTO DELLE FONDAZIONI	12 giorn	gio 21/01/16	ven 05/02/16
6	PREPARAZIONE IN OFFICINA DELLA STRUTTURA IN LEGNO	19 giorn	mar 12/01/16	ven 05/02/16
7	MONTAGGIO DELLA STRUTTURA IN X-LAM E DELLA COPERTURA	15 giorn	lun 08/02/16	ven 26/02/16
8	ISOLAMENTO E POSA DELLA LAMIERA DI COPERTURA	6 giorn	lun 29/02/16	lun 07/03/16
9	TRAMEZZI INTERNI	9 giorn	lun 29/02/16	gio 10/03/16
10	ISOLAMENTO A PAVIMENTO	3 giorn	ven 11/03/16	mar 15/03/16
11	IMPIANTO TERMO FLUIDICO	10 giorn	mer 16/03/16	mar 29/03/16
12	MASSETTO	5 giorn	mer 30/03/16	mar 05/04/16
13	FALDALERIA	8 giorn	lun 29/02/16	mer 09/03/16
14	IMPIANTO ELETTRICO e FOTOVOLTAICO	11 giorn	mer 16/03/16	mer 30/03/16
15	POSA DEI SERRAMENTI ESTERNI	8 giorn	mer 06/04/16	ven 15/04/16
16	RASATURA INTERNA	5 giorn	ven 11/03/16	gio 17/03/16
17	REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO	10 giorn	lun 29/02/16	ven 11/03/16
18	FINITURA DELLA FACCIATA	6 giorn	lun 14/03/16	lun 21/03/16
19	TINTEGGIATURA	6 giorn	ven 18/03/16	ven 25/03/16
20	POSA E REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI	6 giorn	mer 06/04/16	mer 13/04/16
21	POSA PIASTRELLE	5 giorn	ven 18/03/16	gio 24/03/16
22	POSA SANITARI	3 giorn	ven 25/03/16	mar 29/03/16
23	POSA PAVIMENTAZIONE LINOLEUM	6 giorn	lun 28/03/16	lun 04/04/16
24	ZOCCOLINO	3 giorn	mar 05/04/16	gio 07/04/16
25	POSA PORTE INTERNE	3 giorn	mar 05/04/16	gio 07/04/16
26	POSA CORPI ILLUMINANTI	6 giorn	ven 08/04/16	ven 15/04/16
27	DECORAZIONI INTERNE	8 giorn	ven 08/04/16	mar 19/04/16
28	OPERE DI URBANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE DELLE AREE VERDI EST	27 giorn	mer 16/03/16	gio 21/04/16
29	PULIZIA CANTIERE	1 giorno	ven 22/04/16	ven 22/04/16

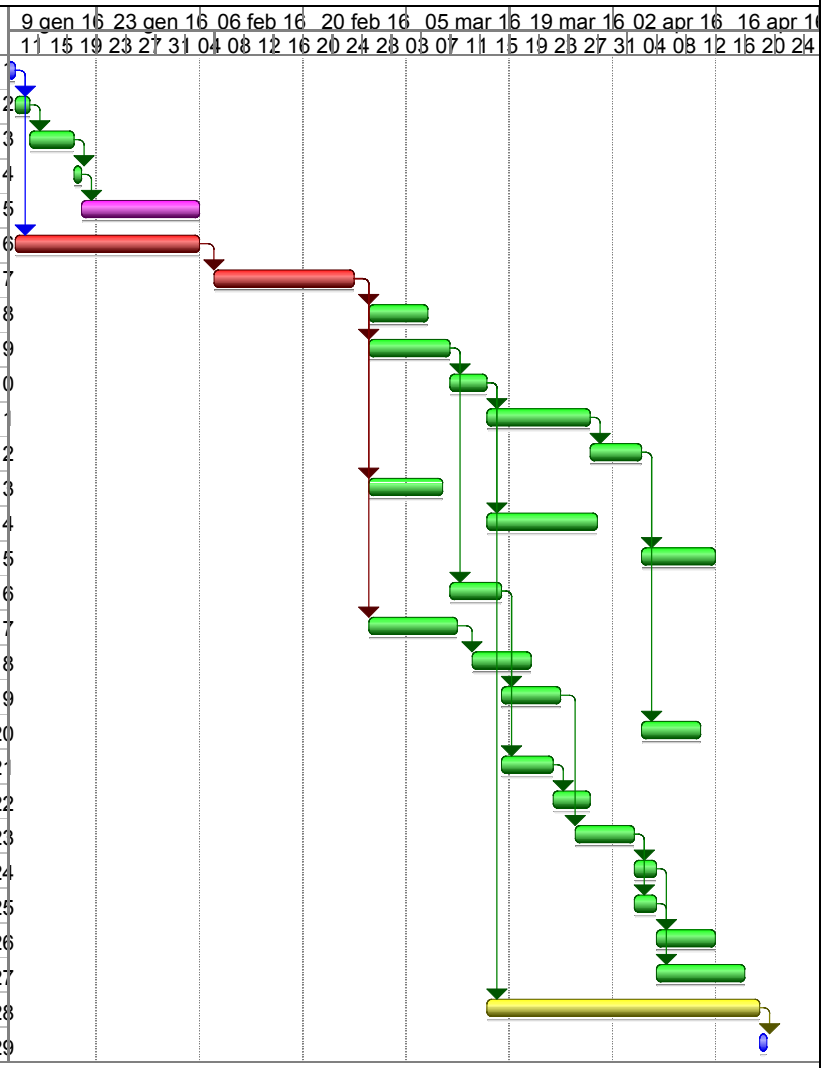

TOT GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI: 102
