allegato "E"

Comune di Monteroni d'Arbia
Provincia di Siena

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CASSIA SUD NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA SAFFI E VIA SARDEGNA

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA.

CANTIERE: via Cassia Sud, Monteroni d'Arbia (Siena)

Monteroni d'Arbia, 09/10/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Perito Edile Bonelli Simone)

per presa visione


IL COMMITTENTE

(Arch. Calocchi Anna)

Perito Edile Bonelli Simone
via delle Vigne 35
53035 Monteriggioni (SI)
Tel.: 057743915 - Fax: 057743915
E-Mail: bonelli@studioec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata
Preparazione delle aree	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Apprestamenti del cantiere	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Impianti del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g
Urbanizzazioni	37 g
Scavi e rinterri	19 g
Scavo a sezione obbligata	3 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2 g
Condutture	15 g
Posa di conduttura fognaria	9 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	4 g
Posa di conduttura elettrica	2 g
Sottoservizi in c.a	13 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	6 g
Sede stradale	2 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2 g
Marciapiede	12 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5 g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavo	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in	2 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	2 g
Formazione di manto in conglomerato bituminaso	2 g
Opere complementari	5 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g
Messa a dimora di piante	3 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	

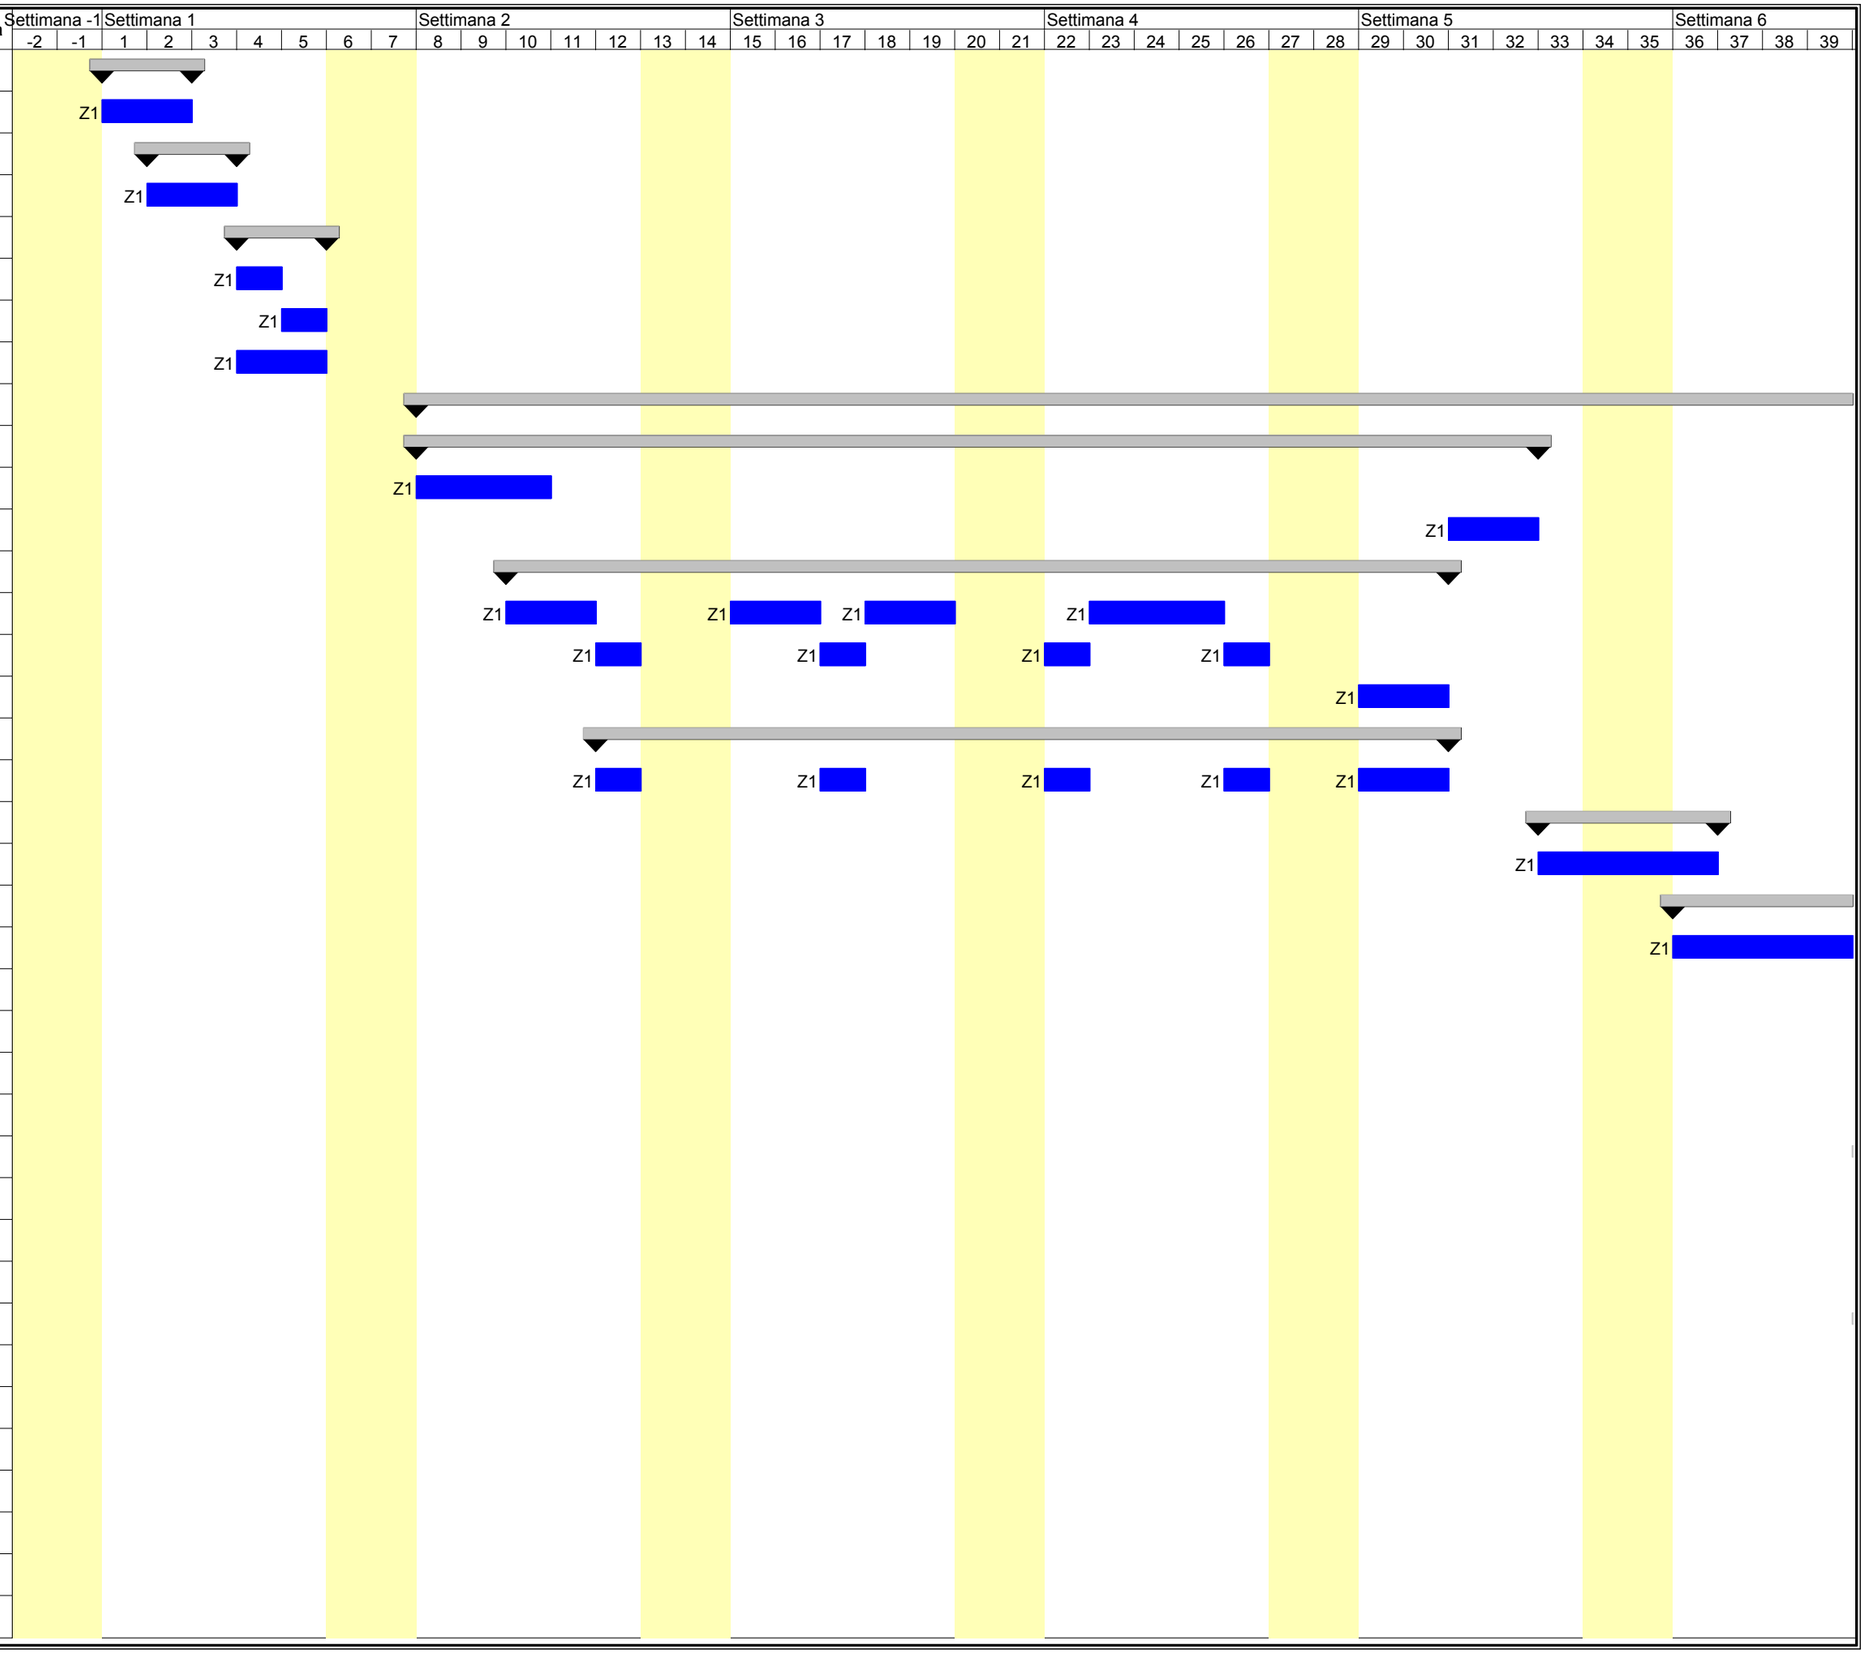

	Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11							Settimana 12							Settimana 13							Settimana 1	
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93

